

CUADRO RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA

PROVEEDOR: ARDYZA EIRL

ITEM	N° DE SEMANA	OS N° 006-2024							
	(DESDE - HASTA)	MINICARGADOR CAT 246C		TOTAL X SEMANA	MINICARGADOR CAT 246D		TOTAL X SEMANA		
		JOSE ANTONIO CESPEDES HUAMANI			ROGER QUISPE PAUCAR				
1	10/01/2024 - 13/01/2024	16.3 HM	S/ 2,033.55	S/ 2,033.55	21.8 HM	S/ 2,727.63	S/ 2,727.63		
2	15/01/2024 - 20/01/2024	40.5 HM	S/ 5,056.57	S/ 5,056.57	39.0 HM	S/ 4,872.37	S/ 4,872.37		
3	22/01/2024 - 31/01/2024	71.7 HM	S/ 8,962.50	S/ 8,962.50	43.5 HM	S/ 5,437.50	S/ 5,437.50		
4	01/02/2024 - 10/02/2024	59.1 HM	S/ 7,387.50	S/ 7,387.50		S/ -	S/ -		
5	12/02/2024 - 17/02/2024	49.0 HM	S/ 6,125.00	S/ 6,125.00		S/ -	S/ -		
6			S/ -	S/ -		S/ -	S/ -		
7			S/ -	S/ -		S/ -	S/ -		
8			S/ -	S/ -		S/ -	S/ -		

TOTALES

S/ 29,565.12 S/ 29,565.12

S/ 13,037.50 S/ 13,037.50

TOTAL S/ 42,602.62

OS N° 006-2024 S/ 33,250.00

DIFERENCIA S/ 9,352.62

* PRIMER MES DE TRABAJO: MINI CAT 246C → S/16,052.62
(10/01 - 31/01) MINI CAT 246D → S/13,037.50

S/29,090.12

* segundo MES DE TRABAJO: (01/02 - 17/02) MINI CAT 246C → S/13,512.50 } Σ = S/42,602.62

* En orden de servicio OS 6-2024 = S/33,250.00

∴ se realizara una 2^{da} orden de servicio por la diferencia del 05/02 al 10/02 por S/9,352.62 (para la MINI CAT 246C)

∴ se realizara una 3^{ra} orden de servicio al 14/02 al 29/02 por S/17,500.00



RESUMEN

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE MINICARGADOR CAT262D - ROGER QUISPE PAUCAR

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/ 2.0833 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	10/01/2024	3630.4	3638.9	8.5	8	S/125.00		30	2.0833		
		2	11/01/2024	3639.1	3647.3	8.2	8	S/125.00		12	2.0833		
		3	12/01/2024	3647.5	3655.7	8.2	8	S/125.00	S/1,000.00	12	2.0833	S/ 25.00	
		4	13/01/2024	3655.9	3661.1	5.2	5	S/125.00	S/ 625.00	12	2.0833	S/ 25.00	
						30.1	29		S/1,625.00	66		S/ 50.00	
REAL CAMPO						21.8			S/1,675.00			S/1,052.63	S/ 2,727.63
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	15/01/2024	3661.3	3669.3	8.0	8	S/125.00		30	2.0833		
		2	16/01/2024	3669.5	3677.6	8.1	8	S/125.00		12	2.0833		
		3	17/01/2024	3677.8	3685.8	8.0	8	S/125.00	S/1,000.00	12	2.0833	S/ 25.00	
		4	18/01/2024	3686.0	3694.6	8.6	8	S/125.00		12	2.0833		
		5	19/01/2024	3694.9	3702.9	8.0	8	S/125.00		12	2.0833		
		6	20/01/2024	3703.3	3708.5	5.2	5	S/125.00	S/ 625.00	12	2.0833	S/ 25.00	
						45.9	45		S/1,625.00	90		S/ 50.00	
REAL CAMPO						39.0			S/1,675.00			S/ 3,197.37	S/ 4,872.37
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	22/01/2024	3708.7	3715.8	7.1	7	S/125.00	S/ 875.00	6	2.0833	S/ 12.50	
		2	23/01/2024	3716	3722.4	6.4	6	S/125.00	S/ 750.00	24	2.0833	S/ 50.00	
		3	24/01/2024	3722.4	3729.6	7.2	7	S/125.00	S/ 875.00	12	2.0833	S/ 25.00	
		4	25/01/2024	3729.6	3736.8	7.2	7	S/125.00	S/ 875.00	12	2.0833	S/ 25.00	
		5	26/01/2024	3736.8	3744.8	8.0	8	S/125.00	S/1,000.00	0	2.0833	S/ 0.00	
		6	27/01/2024	3744.9	3752.5	7.6	7	S/125.00	S/ 875.00	36	2.0833	S/ 75.00	
						43.5	42.0		5250.0	90.0		187.5	S/ 5,437.5

TOTAL DE HORAS ACUMULADA	104.30
--------------------------	--------

TOTAL	S/ 13,037.50
-------	--------------


 CONSORCIO CAKATA
 Vº Bº
 ING. JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PLANO
 92264251

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE MINICARGADOR CAT262D - ROGER QUISPE PAUCAR												
Nº DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/ 2.0833 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	10/01/2024	3630.4	3638.9	8.5	8	S/125.00		30	2.0833	
		2	11/01/2024	3639.1	3647.3	8.2	8	S/125.00		12	2.0833	
		3	12/01/2024	3647.5	3655.7	8.2	8	S/125.00	S/1,000.00	12	2.0833	S/25.00
		4	13/01/2024	3655.9	3661.1	5.2	5	S/125.00	S/625.00	12	2.0833	S/25.00
						30.1	29		S/1,625.00	66		S/50.00

TOTAL S/1,675.00

0.1=6 MIN

POR LO TANTO	COSTO	

POR LO TANTO	
21 HORAS Y 48 MINUTOS	
TOTAL REAL A PAGAR	

PAGO SEGÚN AVANCE DIARIO MINIMO (D=380 mL)		
AVANCE REAL DIARIO	COSTO DIARIO SEGÚN AVANCE X ML	COSTO POR HORA-MAQUINA
150	S/2.632	S/394.74
250	S/2.632	S/657.89
406	OK	
200	OK	
		S/1,052.63

TOTAL S/1,052.63

REAL CAMPO 21.8

S/2,727.63

Vº Bº 
 CONSORCIO QAFATA
 ING. (M) JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUMBO
 42364257



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000008



DÍA	MES	AÑO
10	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
TRABAJO REALIZADO				
7:18	5:21			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3630.4	3658.9

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **8.30**

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 8 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
<u>Roger Quispe Paucar</u>	<u>Juan...</u>	<u>Jesús Benítez Quispe</u>
Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u>	Nombre:	Nombre: <u>Juan...</u>	Nombre: <u>Jesús Benítez Quispe</u>
D.N.I.: <u>48968349</u>	D.N.I.:	D.N.I.: <u>0194440</u>	D.N.I.:



Mantus: Sr Cecilia



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000012



DIA	MES	AÑO
11	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador

PLACA: 262.D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
TRABAJO REALIZADO				
HORAS				
DE	A			
7:23	5:17	Traslado de material saramdeo		
		Traslado de material Para cama		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3639.1	3647.3

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8.12

CONSUMO EN GALONES		
PETROLEO: <u>8</u>	GASOLINA _____	OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G.</u>	Nombre: <u>Emilio Paucar</u>	Nombre: <u>JESUS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01294459</u>	D.N.I.:

CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 No. 11
 ING. (º) JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000010



DIA	MES	AÑO
12	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Guispe Paucar

EQUIPO: minicargador

PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:20	5:15	Traslado de material saramdeo		
		Traslado arena para cama		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3647.5	3655.7

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8.12

CONSUMO EN GALONES		
PETROLEO: <u>8</u>	GASOLINA _____	OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Guispe Paucar</u>	Nombre: <u>Javier Flores G.</u>	Nombre: <u>Cecilia Paucar</u>	Nombre: <u>Jesús Benítez Guispe</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01244449</u>	D.N.I.:

CONSORCIO CARATA
 ING. JESUS BENITEZ GUISEP
 COORDINADOR LOGISTICO - FUND



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000011



DIA	MES	AÑO
13	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 262-D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
TRABAJO REALIZADO				
HORAS				
DE	A			
7.20	1:00	Traslado de material Para Saramdeo		
		Traslado de arena Para Cama		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3655.9	3661.1

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **5.12**

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 5 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G.</u>	Nombre: <u>Cecilia Paucar</u>	Nombre: <u>JESUS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01294468</u>	D.N.I.:

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE MINICARGADOR CAT262D - ROGER QUISPE PAUCAR

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.0833 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
	POR CANCELAR 1ER ORDEN DE SERVICIO	1	15/01/2024	3661.3	3669.3	8.0	8	S/ 125.00		30	2.0833	
		2	16/01/2024	3669.5	3677.6	8.1	8	S/ 125.00		12	2.0833	
		3	17/01/2024	3677.8	3685.8	8.0	8	S/ 125.00	S/ 1,000.00	12	2.0833	S/ 25.00
		4	18/01/2024	3686.0	3694.6	8.6	8	S/ 125.00		12	2.0833	
		5	19/01/2024	3694.9	3702.9	8.0	8	S/ 125.00		12	2.0833	
		6	20/01/2024	3703.3	3708.5	5.2	5	S/ 125.00	S/ 625.00	12	2.0833	S/ 25.00
						45.9	45		S/ 1,625.00	90		S/ 50.00

TOTAL S/ 1,675.00

0.1=6 MIN

POR LO TANTO COSTO

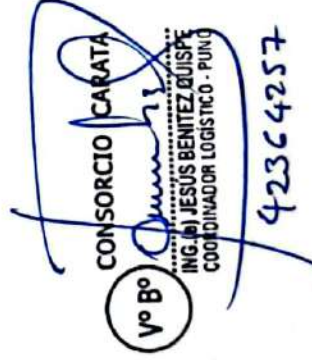
POR LO TANTO
39 HORAS Y 00 MINUTOS
TOTAL REAL A PAGAR

PAGO SEGÚN AVANCE DIARIO MINIMO (D=380 ml.)		
AVANCE REAL DIARIO	COSTO DIARIO SEGÚN AVANCE X ML	COSTO POR HORA-MAQUINA
250	S/ 2.632	S/ 657.89
300	S/ 2.632	S/ 789.47
410	OK	
350	S/ 2.632	S/ 921.05
315	S/ 2.632	S/ 828.95
380	OK	
		S/ 3,197.37

TOTAL S/ 3,197.37

REAL CAMPO **39.0**

S/ 4,872.37


CONSORCIO CARATA
 ING. JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO
 42364257

Vº Bº



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000013



DIA	MES	AÑO
15	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 262.D

HORAS		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
DE	A				
7:45	5:18	Traslado de material sarddeo			
		Traslado de material Para cama			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3661.3	3669.3

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8.0

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 8 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G.</u>	Nombre: <u>Gerardo</u>	Nombre: <u>JESUS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01194440</u>	D.N.I.: <u>92364257</u>

CONSORCIO CARATA
Vº Bº
COORDINADOR LOGISTICO - PUNO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000051



DIA	MES	AÑO
16	01	24

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 362D

HORAS		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
DE	A		362D		
7:45	5:26	Traslado de material para saramdear			
		Traslado de material para cama arena			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3669.5	3677.6

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8.06

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 8

GASOLINA _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
 Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u> D.N.I.: <u>48868244</u>	 Nombre: <u>JULIAN FLORES G</u> D.N.I.: <u>42115410</u>	 Nombre: <u>Ponce</u> D.N.I.: <u>01294449</u>	 Nombre: <u>ING. JESUS BENITEZ QUISPE</u> D.N.I.: <u>42364257</u> <small>COORDINADOR LOGISTICO - BONO</small>



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000052



DIA	MES	AÑO
17	01	24

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:30	5:10	Traslado de material para sacado		
		Traslado de material para cama arena		
		/		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3677.8	3685.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **8.00**

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 8 GASOLINA: _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G</u>	Nombre: <u>ING. (R) JESUS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>48865249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01294449</u>	D.N.I.: <u>42364257</u>



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000053



DÍA	MES	AÑO
18	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: mínicargador

PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:30	5:15	Traslado de material para saramdeo		
		Traslado de material para cama cremu		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3686.0	3694.6

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **8.36**

CONSUMO EN GALONES		
PETROLEO: <u>8</u>	GASOLINA _____	OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
 Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u> D.N.I.: <u>48868249</u>	 Nombre: <u>JAVIER FLORES G.</u> D.N.I.: <u>42115410</u>	 Nombre: <u>Julio O Paucar P.</u> D.N.I.: <u>01294440</u>	 Nombre: <u>ING. (a) JESUS BENITEZ QUISPE</u> COORDINADOR LOGISTICO - PUNO D.N.I.: <u>42364257</u>



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000014



DIA	MES	AÑO
19	01	24

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS	
			<u>262D</u>		
HORAS		TRABAJO REALIZADO			
DE	A				
<u>7:40</u>	<u>5:15</u>	<u>Traslado de material Para</u>			
		<u>Saramdeo</u>			
		<u>Traslado de material Para</u>			
		<u>carra arena</u>			
		<u>Tapado de samja Para</u>			
		<u>compartacion</u>			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
<u>3694.9</u>	<u>3703.0</u>

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8.06

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 8

GASOLINA: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger</u>	Nombre: <u>FLORIS G.</u>	Nombre: <u>Luis</u>	Nombre: <u>ING.(e) JESUS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01694449</u>	D.N.I.: <u>72364257</u>
