

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1230001	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATO SALARIO	30/12/2024	18:59:33	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
6	SOLES	109,337.02	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000387
Fecha y Hora de Ejecución	30/12/2024 - 18:59:33
Abonos procesados	6
Importe cargado por abonos	109,337.02 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	127.82 - SOLES
TOTAL CARGADO	109,464.84 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	36,489.83			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	25,677.11			0	ABONO CORRECTO
3		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	21,121.53			0	ABONO CORRECTO
4		0011-0291-0200503817		CUBAS CHUQUIPOMA ORLANDO RODOL	L - 45073863	1,100.00			0	ABONO CORRECTO
5		002-450-179811596005-54	CREDITO DEL PERU	MADEREAS MUCHIK SRL	R - 20606234296	21,304.19			0	ABONO ENVIADO
6		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPIUY ELENA ISABEL	L - 48602679	3,644.36			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C.
JR. PIZARRO 917 CENTRO TRUJILLO
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20601114888
E001-44

Fecha de Emisión : 31/12/2024
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON
RUC : GRAU C&E
: 20612988774
Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA
: FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : VALORIZACION NRO 01

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO REGION LA LIBERTAD	22667.04	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 11/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 22,667.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 22,667.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,080.07
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 26,747.11

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00741754835 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 1070.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	255821691
Usuario SOL	TERFOUNW
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741754835
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20601114888
Nombre/Razón Social del Proveedor	GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20612988774
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/1070.00
Fecha y hora de pago	02/01/2025 14:04:13
Período Tributario	202412
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000044
Número de operación	7090233493
Número de Pago de Detracciones	

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC
RUC/DNI: 20601114888
DIRECCION: JR. PIZARRO NRO. 917 CENTRO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

DATOS DE ENTREGA

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"

LUGAR DE ENTREGA: OBRA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO
MONEDA: SOLES
NUMERO DE CUENTA : 0011-02540100062862 BBVA

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC: 20612988774
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL
SUB CONTRATISTA NRO 02					
1	SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD - VALORIZACION NRO 01	629.64	M3	S/ 36.00	S/ 22,667.04
SON : VEINTISIES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11/100 SOLES				S/.	22,667.04
				IGV 18%	4,080.07
				TOTAL	26,747.11
				SUJETO A	SI
				DETRACCIÓN	NO
				TASA	4% S/ 1,070.00

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	25,677.11
DETRACCION	S/	1,070.00
TOTAL	S/	26,747.11



ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR: BRAYAN RODRIGUEZ GUANILO

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC : 20481249172
AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Pacasmayo, 27 de diciembre del 2024

INFORME N°026-2024-PLART/ING.CIVIL

Señores

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

A : Cristhian Alexander Ríos Silva
Representante Común _ Consorcio Turístico Malecón C&E

De : Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo

Asunto : CONFORMIDAD AL SERVICIO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN,
ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL _ VALORIZACIÓN 01.

Referencia : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA
DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, así mismo hacerle llegar la conformidad el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material.

AGENTES DEL CONTRATO

Ejecuta el Servicio:

GRUPO CONSULTING E INGENIERA S.A.C _RUC 20601114888

Empresa Contratante:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E _RUC 20612988774

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se detalla las partidas que se realizó para el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DEMOLICIONES	m3
CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA	
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTE	
ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA	

2. AVANCE EJECUTADO

Se detalla el avance ejecutado:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTURA		
2.02	OBRAS EXTERIORES							
02.02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA							
02.02.01.01	EXCAVACIONES							
02.02.01.01.03	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL							100.99
	ALING-06	m3						
	PROG. 0+60 HASTA 0+376.59							
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	29.69	Área:	0.47	13.87	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	39.67	Área:	0.47	18.53	
mayor metrado	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	2.63	Área:	0.47	1.23	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.08	Área:	0.47	2.37	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.10	Área:	0.47	2.38	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.10	Área:	0.47	2.38	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.13	Área:	0.47	2.40	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	7.49	Área:	0.47	3.50	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	39.68	Área:	0.47	18.53	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	3.62	Área:	0.47	1.69	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	7.19	Área:	0.26	1.87	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	22.45	Área:	0.26	5.83	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.06	Área:	0.26	1.31	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.09	Área:	0.26	1.32	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.16	Área:	0.26	1.34	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.10	Área:	0.26	1.32	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.11	Área:	0.26	1.33	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	7.49	Área:	0.26	1.94	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.17	Área:	0.26	1.34	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	28.72	Área:	0.26	7.45	
	MC-2A		1.00	7.49	Área:	0.18	1.32	
	MC-2A		1.00	12.62	Área:	0.18	2.22	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	17.11	Área:	0.16	2.75	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	5.11	Área:	0.16	0.82	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	9.95	Área:	0.16	1.60	
	SOBRECIMIENTO TIPO-1		1.00	2.20	Área:	0.16	0.35	
02.02.01.02	CORTES							
02.02.01.02.01	CORTE MASIVO DE TERRENO A MÁQUINA PARA TERRAZAS							274.13
	SKATE PARK	m3						
	Prog 0+000		1.00	-		21.42	-	
	Prog 0+006.10		1.00	6.10	Area=	22.86	135.05	
	Prog 0+012.20		1.00	6.10	Area=	22.74	139.08	
6	PAVIMENTOS							
6.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.01.02	CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA LIBIANA							254.52
	0+140 - 0+170 (TRAMO N°03)	m3	1.00	30	Área=	8.484	254.52	

3. VALORIZACIÓN N°01

Se cuantifica la Valorización N°01 del periodo del 16 al 27 de diciembre del 2024.

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	
1	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	629.64	S/ 36.00	S/ 22,667.04	
					Costo Directo	S/ 22,667.04
					IGV - 18%	S/ 4,080.07
					TOTAL	S/ 26,747.11

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN N°01	S/ 26,747.11
-------------------	--------------

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1. CONCLUSIONES

- Los trabajos realizados en el **SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS** son DEMOLICIONES, CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTE ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA
- El Volumen ejecutado en el periodo del 16 al 27 de diciembre del 2024 es de 629.64m³.
- El monto a facturar por el servicio es de **S/ 26,747.11 (Veinte y seis mil setecientos cuarenta y siete con 11/100 soles).**

4.2. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tramitar para el pago correspondiente de la Valorización N°01 del periodo del 16 al 27 de diciembre del 2024, el cual asciende al monto **S/ 26,747.11 (Veinte y seis mil setecientos cuarenta y siete con 11/100 soles).**

PANEL FOTOGRÁFICO



Imagen 1: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria

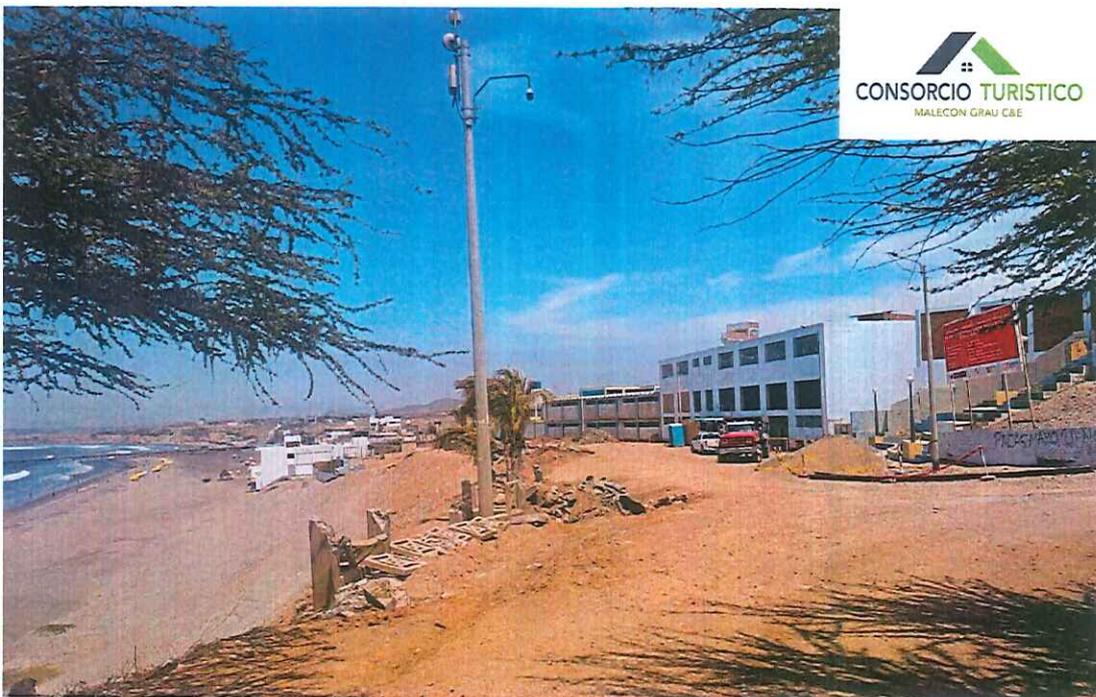


Imagen 2: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MOVIMIENTO DE TIERRA

Conste por el presente documento el contrato de **SUMA ALZADA** por la ejecución de **OBRA** que celebran:

De una parte, **CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**, con RUC N° 20612988774, con domicilio en Av La Molina Nro 827 Urb Santa Felicia 1era Etapa Lima – Lima – La Victoria, representado por el Sr. **RIOS SILVA CRISTHIAN ALEXANDER**, identificado con DNI N° 70470143; quien en lo sucesivo se le denominará **LA EMPRESA** y de la otra parte **GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C**, con RUC 20601114888, con domicilio legal en JR. PIZARRO NRO. 917 CENTRO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO, que en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**; dentro de los términos y condiciones en la clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

LA EMPRESA: es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de sociedad anónima cerrada, dedicada entre otras actividades a la construcción y ejecución de diversos proyectos civiles y ha sido contratado para ejecutar la obra denominada : "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD**"

EL CONTRATISTA : es una empresa especializada en la ejecución de obras de edificación, quien cuenta con la mano de obra especializada, equipos y herramientas para la correcta ejecución de la obra.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:

En cuanto a lo expresado en la cláusula anterior **LA EMPRESA** bajo el régimen de los dispositivos vigentes de la Industria de la Construcción Civil, Subcontrata los servicios de Movimiento de Tierra del **CONTRATISTA** para la ejecución de la partida según anexo 01 que se detallan:

02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01.01	EXCAVACIONES		
02.02.01.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	M3	629.64

TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA declara que conoce el alcance de los servicios contratados y que ha examinado cuidadosamente y a cabalidad los planos y especificaciones técnicas, y que cuenta con la experiencia y el personal especializado en cantidad suficiente para el servicio de los trabajos contratados.

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E
 CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA
 REPRESENTANTE COMUN

EL CONTRATISTA declara que ha inspeccionado y estudiado el lugar donde está ubicada la obra, así como sus alrededores y vías de acceso, y manifiesta que las condiciones correspondientes son adecuadas para el desarrollo de los trabajos contratados.

CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto del contrato **SUMA ALZADA** es de **S/ 36.00** por metro cubico, precio no incluye los impuestos de ley.

QUINTA: DE LA CONTRAPRESTACION

Las partes conviene que la contraprestación que **LA EMPRESA** pague a **EL CONTRATISTA** a todo costo por metro cubico terminado.

SEXTA: FORMA DE PAGO

La contraprestación del servicio será mediante pagos por trabajo concluido previa emisión de conformidad de la supervisión de los trabajos realizados y la suscripción de la valorización correspondientes que sustenten la conformidad del trabajo realizado.

La conformidad de los trabajos será mediante la elaboración de la valorización suscrita por el Residente de Obra, y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado por el mismo. El mismo será validado por el área correspondiente de la oficina central de la empresa, en este caso por el **ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**, en concordancia con el cálculo de la valorización presentada.

La valorización deberá contener mínimo lo siguiente:

- a) Documento físico debidamente sustentado del cálculo del monto valorizado el cual deberá estar suscrito en cada una de sus páginas por el Residente de Obra y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado.
- b) Comprobante de pago (FACTURA)
- c) Algún otro documento que sustente los trabajos efectuados, mapeos, fotografías, etc.

El contratista está obligado a suscribir la valorización que sustente el pago de la prestación realizada verificado en obra por el Residente de Obra. Caso contrario no se podrá generar los pagos correspondientes.

Para todos los casos, el pago de la contraprestación será como máximo 10 días hábiles después de haber cumplido con los requisitos correspondientes.

SEPTIMA: CUENTAS BANCARIAS

EL CONTRATISTA declara de todas las transferencias por concepto de pagos por la contraprestación brindada, según valorización del servicio brindado, serán depositadas en la siguiente cuenta bancaria:

N° CUENTA BBVA 0011-02540100062862

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

La culminación de la primera fase de ejecución será de 45 días calendarios, contados a partir del día que la maquinaria inicio sus operaciones de ejecución de obra, las siguientes fases se desarrollaran según cronograma de obra, establecido por el área técnica.

El proyecto tiene como un plazo contractual de 14 meses de la cual las fases serán programadas por el área técnica.

asimismo, **LA EMPRESA** podrá resolver unilateralmente y de manera automática el contrato antes del vencimiento del plazo previsto ante el incumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, debiendo comunicar su decisión y la fecha prevista para su efectiva resolución. En este caso, **LA EMPRESA** abonará a favor de **EL CONTRATISTA** la retribución pactada por los servicios prestados hasta dicho momento.

La utilización de la presente cláusula, no genera obligación indemnizatoria alguna a cargo de **LA EMPRESA**, en favor de **EL CONTRATISTA**.

NOVENA: RESOLUCION DE CONTRATO

- i. **LA EMPRESA** podrá resolver el contrato a su sola decisión, de forma unilateral, de modo incondicional, de manera automática y sin emitir causal alguna en el momento que lo estime conveniente, ante el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, o algún otro que perjudique la ejecución del objeto contractual o a **LA EMPRESA**, no pudiendo **EL CONTRATISTA** alegar daño emergente ni lucro cesante ni ningún tipo de daño o perjuicio causado por la resolución intempestiva del presente contrato.
- ii. En caso de que **LA EMPRESA** decidiera poner fin al presente contrato, quedará obligado, a pagar a **EL CONTRATISTA** la retribución proporcional correspondiente según el avance del servicio a la fecha de resolución.
- iii. Queda claramente establecido que la resolución del presente contrato operará por la sola declaración de **LA EMPRESA**, operando de modo inmediato la conclusión de contrato y la cesación de todos sus efectos por lo que **EL CONTRATISTA** no podrá reclamar absolutamente nada más allá a lo establecido en el presente contrato
- iv. Asimismo, **LA EMPRESA** no asumirá ninguna responsabilidad más allá de la pactada este contrato ni tampoco la responsabilidad extracontractual o contractual de **EL CONTRATISTA**.

DECIMO PRIMERO: OBLIGACIONES

- i. **EL CONTRATISTA** se obliga a:
 - Suministrar los equipos y prestar los servicios, objeto del presente contrato por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.
 - Contar con personal técnico y especializado para la prestación del servicio materia del presente contrato, asumiendo, de forma exclusiva, la dirección del mismo. Sin perjuicio de ello, el trabajo se deberá ejecutar de acuerdo al Anexo N° 01, así como cualquier documentación criteriosa de carácter técnico que permita la ejecución de la presente prestación, sin alterar los costos establecidos en la cláusula cuarta correspondiente al monto contractual a favor ni en contra de ninguna de las partes.
 - Proporcionar el personal en cantidad suficiente para cumplir con los programas de avance, calidad y seguridad de los trabajos.
 - Cumplir con el avance de las actividades previas necesarias a fin de que **EL CONTRATISTA**, pueda cumplir cabalmente con la prestación a su cargo.
 - Tendrá que cumplir con la compra y uso de Epps correspondientes (Bota, Chaleco, y Guantes).
 - Proveer alimentación y alojamiento a su personal.
 - Transporte de su personal a la zona donde se van a ejecutar los trabajos.

- Contar con personal calificado/encargado en campo para las coordinaciones de sus requerimientos con un plazo mínimo de 01 semana.
 - Adquirir el SCTR de su personal
- ii. **LA EMPRESA** se obliga a:
- Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda la información que solicite con referencia a la obra según anexo detallado

DECIMO SEGUNDA: FUERO DE CONTROVERSIA

Las partes se someten expresamente a los Jueces y Tribunales de la provincia de Pacasmayo. El cambio de domicilio no afecta el sometimiento de las partes a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales antes mencionados.

En señal de conformidad se firma por duplicado, en el distrito de Pacasmayo, el 16 de Diciembre del año 2024.



EL CONTRATISTA
GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC
RUC : 20601114888,



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E
CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA
REPRESENTANTE COMÚN

LA EMPRESA
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU
C&E
RUC : 20606234296
