

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

| Nro. Orden | Planilla | Descripción | Enviada | | Cuenta de Cargo |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Fecha | Hora | |
| 1214005 | PAGO DE PROVEEDORES | PROVEEDORES 14 12 24 | 14/12/2024 | 14:57:22 | 0011-0262-0100032460 |
| Abonos Enviados | Moneda de Cargo | Importe Inicialmente Informado | Horario de Ejecución | | Situación de Proceso |
| 5 | SOLES | 103,545.53 | INMEDIATA | | ABONOS OK |

Consulta de la Orden - Después del proceso

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| No. Movimiento de Cargo | 000000323 |
| Fecha y Hora de Ejecución | 14/12/2024 - 14:57:22 |
| Abonos procesados | 5 |
| Importe cargado por abonos | 103,545.53 - SOLES |
| Abonos NO procesados | 0 |
| Importe NO abonado | 0.00 - SOLES |
| Comisión por Otra Plaza | 0.00 - SOLES |
| Comisión Interbancaria | 144.92 - SOLES |
| TOTAL CARGADO | 103,690.45 - SOLES |

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

| Sel | No. | Cuenta | Banco | Titular | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. | Situación |
|-----|-----|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | | 002-450-179811596005-54 | CREDITO DEL PERU | MADERAS MUCHICK SRL | R - 20606234296 | 24,154.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 2 | | 0011-0291-0200217938 | | TRANSPORTES DON GONZALO SRL | R - 20559614506 | 12,744.00 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 3 | | 0011-0814-0257137223 | | HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL C | L - 72969991 | 5,098.00 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 4 | | 0011-0864-0100062862 | | GRUPO CONSULTING E INGENIERIA | R - 20601114888 | 55,776.95 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 5 | | 0011-0249-0202120274 | | LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL | L - 48602679 | 5,772.58 | | | 0 | ABONO CORRECTO |

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjeria
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

| Entidad Financiera | Hora de envío de tu operación | Hora en que tu operación llegará al Banco destino | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| | | Días útiles | Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público |
| -Banco de Crédito -Sotobank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca | Hasta las 11:30 a.m | A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil | A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil |
| | Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m. | A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil | |
| | Después de la 1:45 p.m. | A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil | |



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA
LIMA - LIMA - LA MOLINA
20612988774
Teléfono: 044-292713

ORDEN DE PAGO
N° 0267 - 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 14/12/2024
INSTITUCION FINANCIERA: MN - BBVA
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)
A LA ORDEN DE: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC
NRO DE CUENTA: MN - BBVA 001102540100062862
BENEFICIARIO: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC
NRO DE CUENTA:

| DETALLE | | IMPORTE |
|--|--|----------------------|
| PAGO: ALQUILER DE CISTERNA POR 16 VIAJES DEL 03 AL 22 NOVIEMBRE 2024 | | S/ 55,776.95 |
| TOTAL FACTURA: | | S/ 69,591.29 |
| DETRACCION 4%: | | S/ 2,784.00 |
| TOTAL DEPÓSITO: | | S/ 66,807.29 |
| A CUENTA: | | S/ 11,030.34 |
| SALDO PENDIENTE: | | S/ 55,776.95 |
| TOTAL | | S/. 55,776.95 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL GENERAL | S/. 55,776.95 |
|----------------------|----------------------|

GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C.JR. PIZARRO 917 CENTRO TRUJILLO
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601114888****E001-38**

Fecha de Emisión : **17/12/2024** Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**
: **MALECON GRAU C&E**

RUC : **20612988774**

Dirección del Cliente : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN**
: **TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-**
: **LIMA-LA MOLINA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS RELLENO CON MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO REGION LA LIBERTAD VALORIZACION NRO 01 | 58975.67 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO Y 29/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 58,975.67 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 58,975.67 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 10,615.62 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 69,591.29 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción

Medio Pago: 003 Transferencia de fondos

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00741754835 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 2784.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 254624172 |
| Usuario SOL | TERFOUNW |
| N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00741754835 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| Ruc del Proveedor | 20601114888 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20612988774 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C& |
| Tipo de Operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 030 - Contratos de Construcción |
| Monto del depósito | S/2784.00 |
| Fecha y hora de pago | 19/12/2024 16:06:18 |
| Periodo Tributario | 202412 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 - 00000038 |
| Número de operación | 6834042083 |
| Número de Pago de Detracciones | |

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC
RUC/DNI: 20601114888
DIRECCION: JR. PIZARRO NRO. 917 CENTRO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

DATOS DE ENTREGA

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"
LUGAR DE ENTREGA: OBRA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO
MONEDA: SOLES
NUMERO DE CUENTA : 0011-02540100062862 BBVA

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC: 20612988774
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | |
|---|--|-----------|--------|-----------------|-----------|-------------|
| 1 | POR EL SUB CONTRATO DE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO CON MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD - VALORIZACION NRO 01 | 1295.03 | M3 | S/ 45.54 | S/ | 58,975.67 |
| SON : SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 29/100 SOLES | | SUB TOTAL | | S/. | 58,975.67 | |
| | | IGV 18% | | | 10,615.62 | |
| | | TOTAL | | S/. | 69,591.29 | |
| | | | | SUJETO A | SI | |
| | | | | DETRACCIÓN | NO | |
| | | | | TASA | 4% | S/ 2,784.00 |

| | | |
|--------------------------|----|-----------|
| NETO A PAGAR A PROVEEDOR | S/ | 66,807.29 |
| DETRACCION | S/ | 2,784.00 |
| TOTAL | S/ | 69,591.29 |



ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR: BRAYAN RODRIGUEZ GUANILO

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC : 20481249172
AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Handwritten notes:
D/c. 58 560.95
Incl. DR. 2784. → Elena
Cta Grupo 55 776.95

Pacasmayo, 12 de diciembre del 2024

INFORME N°016-2024-PLART/ING.CIVIL

Señores

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

A : Cristhian Alexander Ríos Silva
Representante Común _ Consorcio Turístico Malecón C&E

De : Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo

Asunto : Conformidad al Servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material_VAL 01.

Referencia : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, así mismo hacerle llegar la conformidad el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material.

AGENTES DEL CONTRATO

Ejecuta el Servicio:

GRUPO CONSULTING E INGENIERA S.A.C _RUC 20601114888

Empresa Contratante:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E _RUC 20612988774

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se detalla las partidas que se realizó para el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|---|--------|
| CARGADOR FRONTAL, ZARANDEAR MATERIAL | m3 |
| MOTONIVELADORA, CONFORMAR MATERIAL DE RELLENO | |
| RODILLO, COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO | |

2. AVANCE EJECUTADO

Se detalla el avance ejecutado:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo
CIP. 279534
INGENIERO DE CALIDAD

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | N° DE VECES | MEDIDAS | | | PARCIAL | TOTAL |
|----------|---|--------|-------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| | | | | LARGO | ANCHO | ALTURA | | |
| 6 | PAVIMENTOS | | | | | | | |
| 6.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | |
| 06.01.05 | RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL PROPIO C/MAQUINARIA LIVIANA | | | | | | | 1,295.03 |
| | 0+220 – 0+380 (TRAMO N°06) | m3 | 1.00 | 160 | Área= | 8.0939 | 1,295.03 | |

3. VALORIZACIÓN N°01

Se cuantifica la Valorización N°01 del periodo del 29 de noviembre al 06 de diciembre del 2024.

| Item | Descripción | Unidad | Metrado | Precio | Parcial |
|------|--|--------|----------|----------------------|---------------------|
| 1 | SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO CON MAQUINARIA | m3 | 1,295.03 | S/ 45.54 | S/ 58,975.67 |
| | | | | Costo Directo | S/ 58,975.67 |
| | | | | IGV - 18% | S/ 10,615.62 |
| | | | | TOTAL | S/ 69,591.29 |

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

| | |
|-------------------|--------------|
| VALORIZACIÓN N°01 | S/ 69,591.29 |
|-------------------|--------------|

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1. CONCLUSIONES

- Los trabajos realizados en el **SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS – RELLENO CON MAQUINARIA** son CARGADOR FRONTAL ZARANDEAR MATERIAL, MOTONIVELADORA CONFORMAR MATERIAL DE RELLENO, RODILLO COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO
- Los metros cúbicos ejecutados en el periodo del 29 de noviembre al 06 de diciembre del 2024 es de 1,295.03 m3.
- El monto a facturar por el servicio es de S/ 69,591.29 (Sesenta y nueve mil quinientos noventa y uno con 29/100 soles).

4.2. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tramitar para el pago correspondiente de la Valorización N°01 del periodo del 29 de noviembre al 06 de diciembre del 2024, el cual asciende al monto a S/ 69,591.29 (Sesenta y nueve mil quinientos noventa y uno con 29/100 soles).

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

 Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo
 CIP. 279534
 INGENIERO DE CALIDAD

PANEL FOTOGRÁFICO

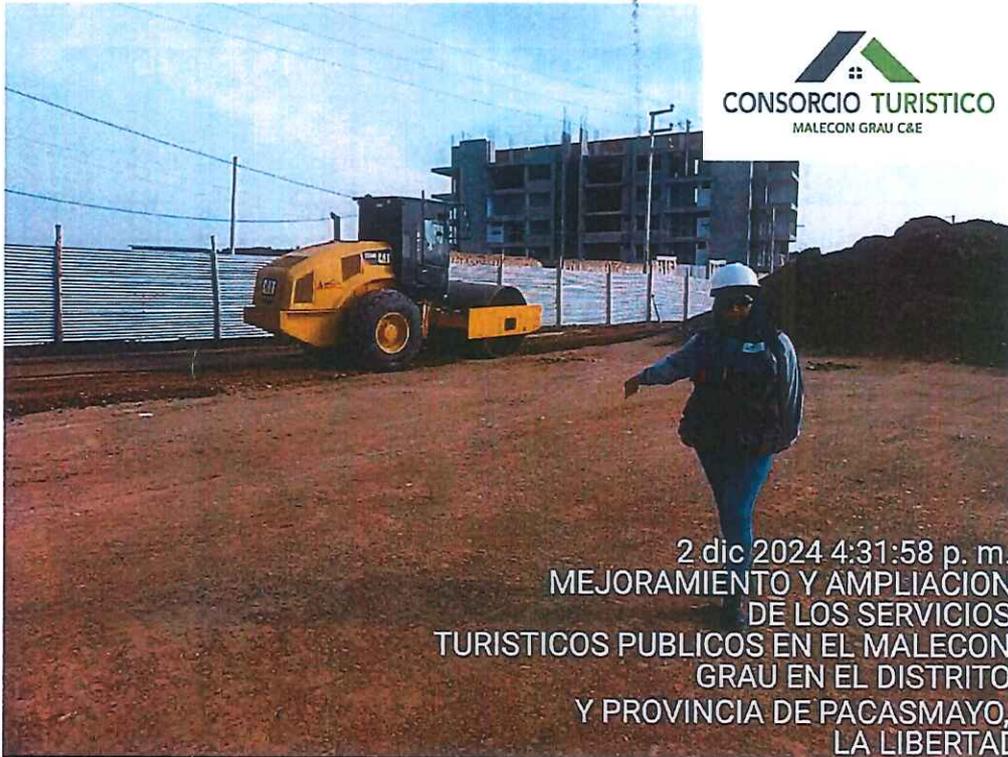


Imagen 1: Trabajos de movimiento de tierras relleno c/maquinaria



Imagen 2: Trabajos de movimiento de tierras relleno c/maquinaria

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo
CIP. 279534
INGENIERO DE CALIDAD



Imagen 3: Trabajos de movimiento de tierras relleno c/maquinaria

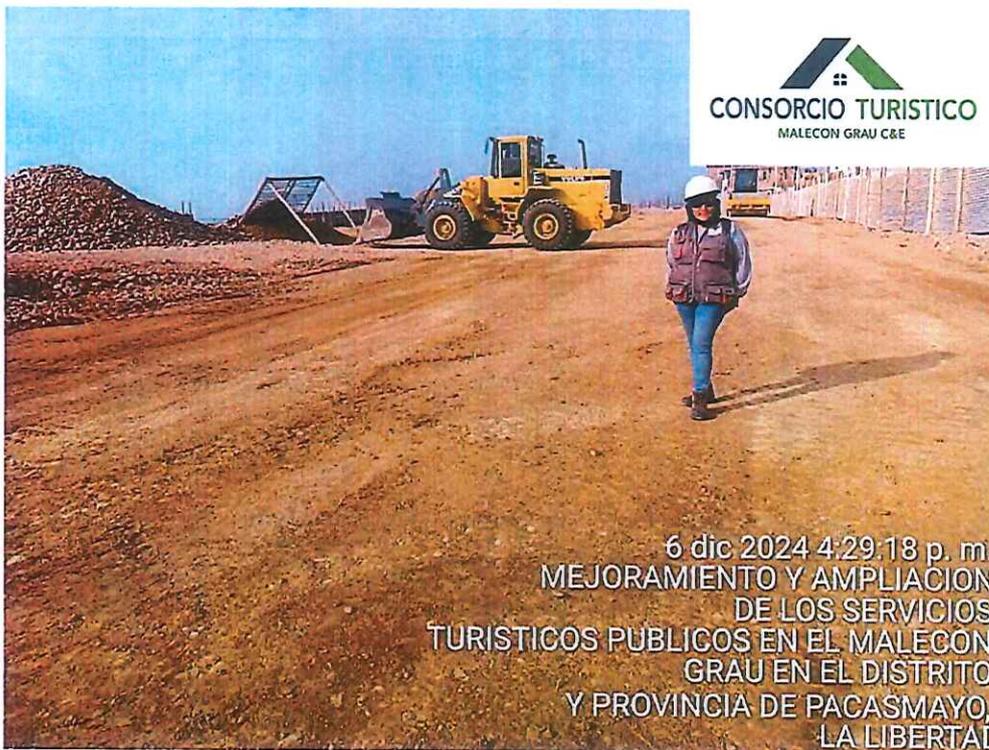


Imagen 4: Trabajos de movimiento de tierras relleno c/maquinaria


CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo
CIP. 279534
INGENIERO DE CALIDAD

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MOVIMIENTO DE TIERRA-
RELLENO CON MAQUINARIA**

Conste por el presente documento el contrato de **PRECIOS UNITARIOS** por la ejecución de **OBRA** que celebran:

De una parte, **CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**, con RUC N° **20612988774**, con domicilio en Av La Molina Nro 827 Urb Santa Felicia 1era Etapa Lima - Lima - La Molina, representado por el Sr. **RIOS SILVA CRISTHIAN ALEXANDER**, identificado con DNI N° **70470143**; quien en lo sucesivo se le denominará **LA EMPRESA** y de la otra parte **GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C**, con RUC **20601114888**, con domicilio legal en **JR. PIZARRO NRO. 917 CENTRO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**, representado por el Sr. **RIOS CONTRERAS SEGUNDO FAUSTINO**, identificado con DNI N° **19565757** que en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**; dentro de los términos y condiciones en la clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

LA EMPRESA: es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de sociedad anónima cerrada, dedicada entre otras actividades a la construcción y ejecución de diversos proyectos civiles y ha sido contratado para ejecutar la obra denominada : "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD**"

EL CONTRATISTA : es una empresa especializada en la ejecución de obras de edificación, quien cuenta con la mano de obra especializada, equipos y herramientas para la correcta ejecución de la obra.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:

En cuanto a lo expresado en la cláusula anterior **LA EMPRESA** bajo el régimen de los dispositivos vigentes de la Industria de la Construcción Civil, Subcontrata los servicios de Movimiento de Tierra del **CONTRATISTA** para la ejecución de la partida según anexo 01 que se detallan:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | N° DE VECES | MEDIDAS | | | PARCIAL | TOTAL |
|----------|---|--------|-------------|---------|-------|--------|---------|----------|
| | | | | LARGO | ANCHO | ALTURA | | |
| 6 | PAVIMENTOS | | | | | | | |
| 6.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | |
| 06.01.05 | RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL PROPIO C/MAQUINARIA LIVIANA | | | | | | | 1,295.03 |
| | 0+220 - 0+380 (TRAMO N°06) | m3 | 1.00 | 160 | Área= | 8.0939 | 1,2 | |

TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA declara que conoce el alcance de los servicios contratados y que ha examinado cuidadosamente y a cabalidad los planos y especificaciones técnicas, y que cuenta con la experiencia y el personal especializado en cantidad suficiente para el servicio de los trabajos contratados.

EL CONTRATISTA declara que ha inspeccionado y estudiado el lugar donde está ubicada la obra, así como sus alrededores y vías de acceso, y manifiesta que las condiciones correspondientes son adecuadas para el desarrollo de los trabajos contratados.

CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto del contrato Pecios Unitarios es de **S/ 45.54** por metro cubico, precio no incluye los impuestos de ley.

QUINTA: DE LA CONTRAPRESTACION

Las partes conviene que la contraprestación que **LA EMPRESA** pague a **EL CONTRATISTA** a todo costo por metro cubico terminado.

SEXTA: FORMA DE PAGO

La contraprestación del servicio será mediante pagos por trabajo concluido previa emisión de conformidad de la supervisión de los trabajos realizados y la suscripción de la valorización correspondientes que sustenten la conformidad del trabajo realizado.

La conformidad de los trabajos será mediante la elaboración de la valorización suscrito por el Residente de Obra, y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado por el mismo. El mismo será validado por el área correspondiente de la oficina central de la empresa, en este caso por el **ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**, en concordancia con el cálculo de la valorización presentada.

La valorización deberá contener mínimo lo siguiente:

- a) Documento físico debidamente sustentado del cálculo del monto valorizado el cual deberá estar suscrito en cada una de sus páginas por el Residente de Obra y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado.
- b) Comprobante de pago (FACTURA)
- c) Algún otro documento que sustente los trabajos efectuados, mapeos, fotografías, etc.

El contratista está obligado a suscribir la valorización que sustente el pago de la prestación realizada verificado en obra por el Residente de Obra. Caso contrario no se podrá generar los pagos correspondientes.

Para todos los casos, el pago de la contraprestación será como máximo 10 días hábiles después de haber cumplido con los requisitos correspondientes.

SEPTIMA: CUENTAS BANCARIAS

EL CONTRATISTA declara de todas las transferencias por concepto de pagos por la contraprestación brindada, según valorización del servicio brindado, serán depositadas en la siguiente cuenta bancaria:

N° CUENTA BBVA 0011-02540100062862

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

La culminación de la primera fase de ejecución será de 45 días calendarios, contados a partir del día que la maquinaria inicio sus operaciones de ejecución de obra, las siguientes fases se desarrollaran según cronograma de obra, establecido por el área técnica.

El proyecto tiene como un plazo contractual de 14 meses de la cual las fases serán programadas por el área técnica.

asimismo, **LA EMPRESA** podrá resolver unilateralmente y de manera automática el contrato antes del vencimiento del plazo previsto ante el incumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, debiendo comunicar su decisión y la fecha prevista para su efectiva resolución. En este caso, **LA EMPRESA** abonará a favor de **EL CONTRATISTA** la retribución pactada por los servicios prestados hasta dicho momento.

La utilización de la presente cláusula, no genera obligación indemnizatoria alguna a cargo de **LA EMPRESA**, en favor de **EL CONTRATISTA**.

NOVENA: RESOLUCION DE CONTRATO

- i. **LA EMPRESA** podrá resolver el contrato a su sola decisión, de forma unilateral, de modo incondicional, de manera automática y sin emitir causal alguna en el momento que lo estime conveniente, ante el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, o algún otro que perjudique la ejecución del objeto contractual o a **LA EMPRESA**, no pudiendo **EL CONTRATISTA** alegar daño emergente ni lucro cesante ni ningún tipo de daño o perjuicio causado por la resolución intempestiva del presente contrato.
- ii. En caso de que **LA EMPRESA** decidiera poner fin al presente contrato, quedará obligado, a pagar a **EL CONTRATISTA** la retribución proporcional correspondiente según el avance del servicio a la fecha de resolución.
- iii. Queda claramente establecido que la resolución del presente contrato operará por la sola declaración de **LA EMPRESA**, operando de modo inmediato la conclusión de contrato y la cesación de todos sus efectos por lo que **EL CONTRATISTA** no podrá reclamar absolutamente nada más allá a lo establecido en el presente contrato
- iv. Asimismo, **LA EMPRESA** no asumirá ninguna responsabilidad más allá de la pactada este contrato ni tampoco la responsabilidad extracontractual o contractual de **EL CONTRATISTA**.

DECIMO PRIMERO: OBLIGACIONES


- i. **EL CONTRATISTA** se obliga a:
 - Suministrar los equipos y prestar los servicios, objeto del presente contrato por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.
 - Contar con personal técnico y especializado para la prestación del servicio materia del presente contrato, asumiendo, de forma exclusiva, la dirección del mismo. Sin perjuicio de ello, el trabajo se deberá ejecutar de acuerdo al Anexo N° 01, así como cualquier documentación criteriosa de carácter técnico que permita la ejecución de la presente prestación, sin alterar los costos establecidos en la cláusula cuarta correspondiente al monto contractual a favor ni en contra de ninguna de las partes.
 - Proporcionar el personal en cantidad suficiente para cumplir con los programas de avance, calidad y seguridad de los trabajos.
 - Cumplir con el avance de las actividades previas necesarias a fin de que **EL CONTRATISTA**, pueda cumplir cabalmente con la prestación a su cargo.
 - Tendrá que cumplir con la compra y uso de Epps correspondientes (Bota, Chaleco, y Guantes).
 - Proveer alimentación y alojamiento a su personal.
 - Transporte de su personal a la zona donde se van a ejecutar los trabajos.

- Contar con personal calificado/encargado en campo para las coordinaciones de sus requerimientos con un plazo mínimo de 01 semana.
 - Adquirir el SCTR de su personal
- ii. **LA EMPRESA** se obliga a:
- Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda la información que solicite con referencia a la obra según anexo detallado

DECIMO SEGUNDA: FUERO DE CONTROVERSIAS

Las partes se someten expresamente a los Jueces y Tribunales de la provincia de Pacasmayo. El cambio de domicilio no afecta el sometimiento de las partes a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales antes mencionados.

En señal de conformidad se firma por duplicado, en el distrito de Pacasmayo, el 29 de Noviembre del año 2024.



GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C
Segundo Faustino Rios Contreras
GERENTE GENERAL

EL CONTRATISTA
GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC
RUC : 20601114888,



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E
CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA
REPRESENTANTE COMUN

LA EMPRESA
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU
C&E
RUC : 20606234296
